

Demain la 7 à vivre



www.la7avivre.fr

INFO-TRAVAUX Le Kremlin-Bicêtre

Lettre d'information du 5 octobre 2011

Malgré tous nos efforts pour coordonner les interventions des différentes entreprises, le chantier de réaménagement des trottoirs sur le côté pair de la RD7 a pris du retard par rapport au calendrier initial.

En effet, les entreprises concessionnaires interviennent chacune sur leur propre réseau (eau, gaz, électricité, téléphone, etc.). Leurs différentes actions doivent donc être parfaitement coordonnées pour que le chantier puisse se dérouler correctement. Or, ces travaux ont été plus difficiles que prévu car de nombreux réseaux inconnus et non répertoriés ont été découverts dans le sous-sol, déjà très encombré. Pour des travaux de cette ampleur, il est donc nécessaire d'adapter sans cesse le projet en fonction des aléas du chantier.

Toutefois, le Conseil général a mis en place de nouvelles dispositions dans l'organisation du chantier afin de maîtriser ce retard et maintenir l'objectif de fin 2012 pour le réaménagement global de la RD7 au Kremlin-Bicêtre.

Ainsi, avec l'accord de la mairie, le marché de produits manufacturés, situé sur la RD7, entre la rue de la Convention et l'avenue Eugène-Thomas, sera déplacé sur l'avenue Eugène-Thomas, à compter du 16 octobre prochain, et ce jusqu'en avril 2012.

Cette mesure permettra de limiter les interactions entre la vie du chantier et les usages du marché et ainsi de rattraper le retard sur le calendrier. Vous trouverez au dos de cette lettre le nouveau calendrier des travaux à venir sur votre ville.

Afin de réduire la gêne, le Conseil général veillera à maintenir deux voies de circulation dans chaque sens. Tout au long de ce chantier, les accès pour les riverains et les livraisons pour les commerces resteront toujours possibles. Une attention particulière sera également portée à la sécurité des piétons, avec la mise en place d'itinéraires protégés sur chaque rive.

Nos deux agents d'information sont toujours présents sur le terrain pour vous informer des dernières évolutions du chantier et pour vous aider face à toute difficulté que vous pourriez rencontrer en raison des travaux. N'hésitez pas à les solliciter.

Soyez assurés que le Département met tout en œuvre pour que cette opération se déroule dans les meilleures conditions et dans le respect des délais annoncés.

Merci de votre compréhension.

*La direction des Transports,
de la Voirie et des Déplacements*

VOIR CALENDRIER DES TRAVAUX AU DOS ->


Posez vos questions,
partagez votre avis :
travaux-rd7@cg94.fr



CONTACT
Service grands projets
au 01 49 56 55 64

DÉROULEMENT DES TRAVAUX AU KREMLIN-BICÊTRE

Le calendrier des travaux est donné à titre indicatif. Il peut être modifié à tout moment par le Conseil général en fonction des besoins du chantier et des conditions météorologiques. Cette flexibilité permet de faire avancer les travaux dans les meilleurs délais, tout en tenant compte des demandes de la ville et des habitants.

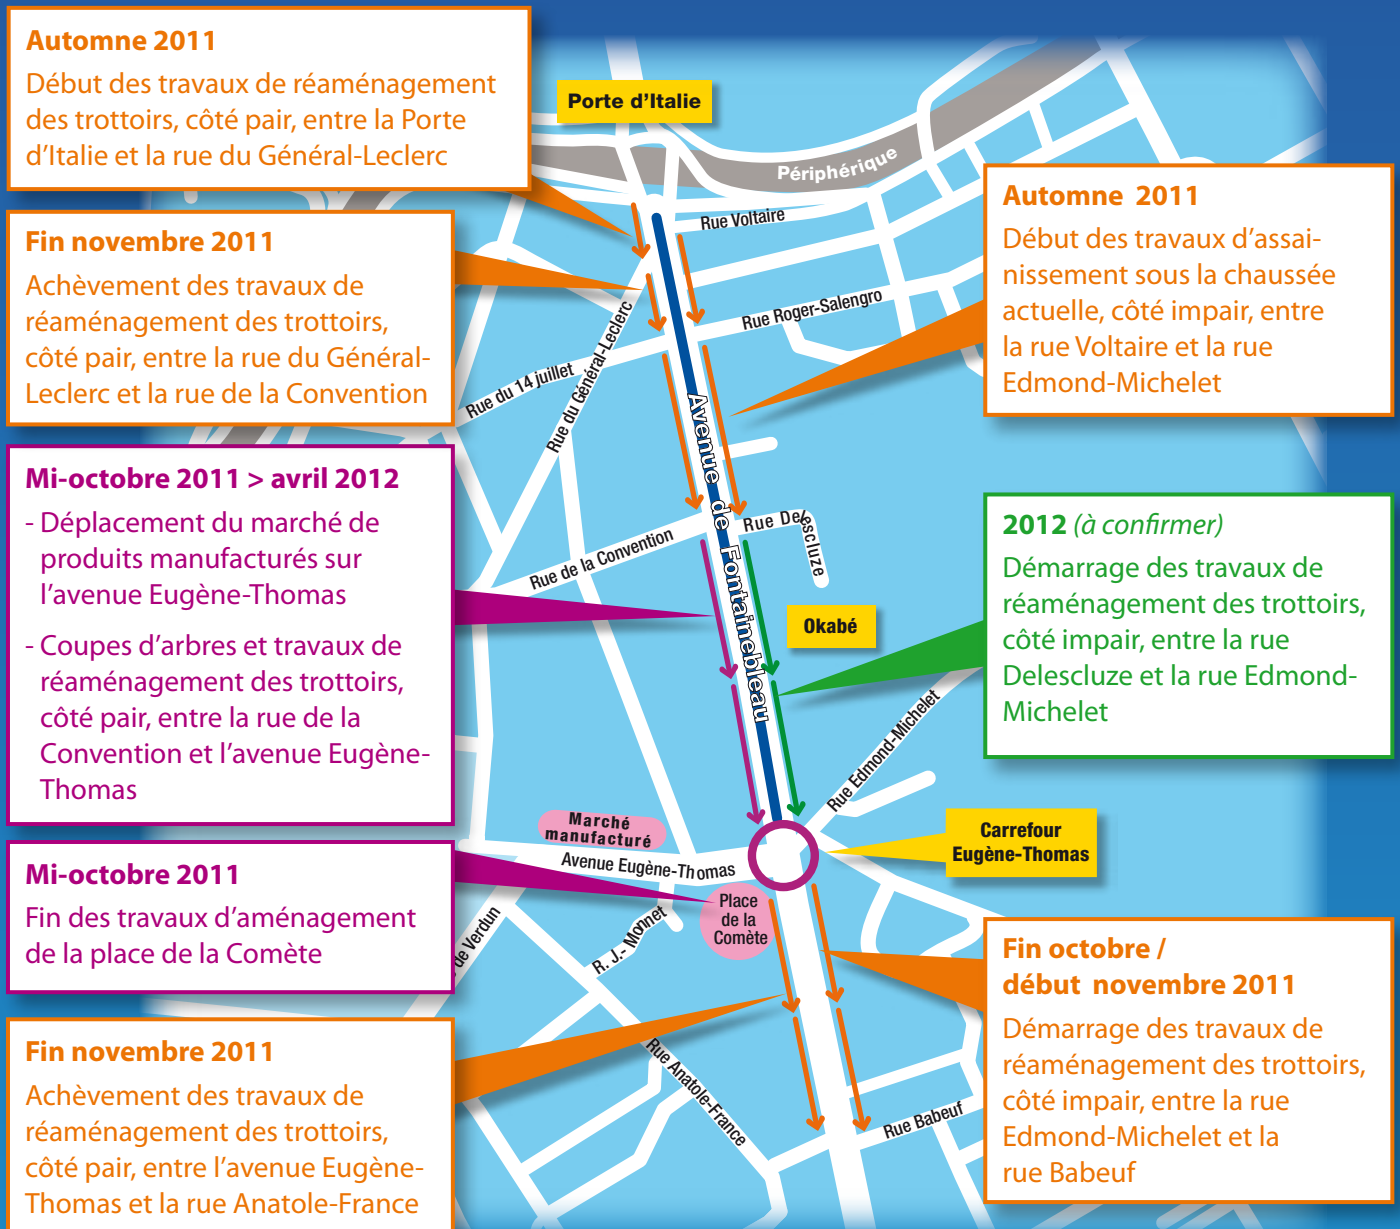

En parallèle, les travaux de la RATP se poursuivent. Ils consistent à déplacer des câbles et à modifier les bouches d'aération du métro, pour les mettre à niveau avec le projet de réaménagement de la RD7.

Septembre > fin novembre 2011

Travaux sur le trottoir impair, devant le centre commercial Okabé

Octobre > fin novembre 2011

Travaux sur le trottoir pair au niveau du n° 98
